



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 019	Fecha Informe: 24-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 019, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°061 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°062 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, 01 TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y JEFE DE LABORATORIO.

- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD Y ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

3) OTROS

- RESPECTO A LA REUNION DEL DIA 23.07.2021, SE REALIZO COORDINACION CON EL PROPIETARIO DE LAS AREAS AUXILIARES CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISION CON RESULTADOS NEGATIVOS, SIN EMBARGO, SE CONTINUA CON EL DIALOGO A EFECTOS DE LLEGAR A UN BUEN TERMINO ESPERANDO QUE ESTE SEA CON PRONTITUD.

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO), Y REPLANTEO DEL EJE DE VIA, ASÍ MISMO LA INSPECCIÓN GEOLÓGICA POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.

- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN.

• ACCIONES DEL CONTRATISTA:

- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS AUXILIARES, ESTA IMPOSIBILITADO DE DAR INICIO A LA PARTIDA CONTRACTUAL 202.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO.

- EL CONTRATISTA COMUNICA A LA SUPERVISION, CON RELACIÓN A LA UTILIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO SE ALCANZARÁ LA INFORMACIÓN TAN LUEGO SEA DERIVADO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONSORCIO.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA DEL PRESENTE MES, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS METAS PREVISTAS PARA EVITAR POSIBLES ATRASOS QUE GENEREN UN NUEVO CALENDARIO QUE CONTEMPLA LA ACELERACION DE LOS TRABAJOS.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR EL REPLANTEO CORREGIDO DEL TRAZO DE EJE DE VIA, PARA SU REVISION Y DAR LA CONFORMIDAD A EFECTOS DE QUE SE REALICE EN FORMA URGENTE LA DEMARCAION DEL DERECHO DE VIA.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS:
 - * ESPECIALISTA TÉCNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
 - * ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
 - * ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON INFORMAR SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO.

Auditoria Fecha De Creación:
24-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
24-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE	No Aplica	24-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
REPLANTEO DE EJE DE VIA

CDescripcion _____:
MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
SE REALIZO LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE EJE DE VIA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 26+500
CANTERA MACA

CDescripcion_____:

2

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1:

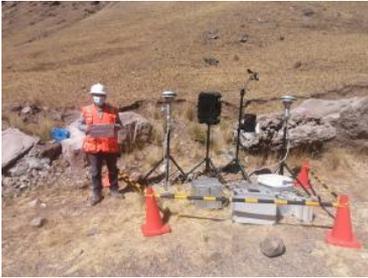


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

INSPECCION GEOLOGICA
PROGRESIVA KM. 19+835 AL KM. 29+790

CDescripcion_____:

PERSONAL: 01 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA(SUPERVISION), 01 INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS(CONTRATISTA), 01 JEFE DE LABORATORIO(CONTRATISTA), 01 AYUDANTE.
SE REALIZO LA VERIFICACION EN CAMPO DEL TRAMO DE LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE RUIDO PROGRESIVA KM. 26+400

CDescripcion_____:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE RUIDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:

MA & T SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.
 RUC: 20509031000000
 VEDEROS DE CAMIONETA 11A, VEH. 11, BUSES Y SERVICIOS COMPAÑAL

FORMA DE REGISTRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

UBI	11000000000000000000	FECHA: 24/07/21
PROYECTO	MA&T SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.	
CONDUCTOR	CAMIONETA DOBLE CABRA 4X4	
MODELO	MITSUBISHI L200	
PLACA	VPR-870	
SECCION	2017	
CONDUCTOR	CELEST GARCAYO CHILD	
CONDUCTOR	CELEST GARCAYO CHILD	
ALQUILER DE SERVICIO	11.7.2021	11.7.2021
ALQUILER DE SERVICIO	11.7.2021	11.7.2021
ALQUILER DE SERVICIO	11.7.2021	11.7.2021

EL CONDUCTOR GUARDA CON LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. SI NO ()

Estado de Proteccion Personal: Correcto Deficiente. Antes de ingresar al servicio, el personal de seguridad debe verificar el estado de los equipos de proteccion personal y reportarlo al supervisor.

FECHA DE REGISTRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
 24-07-2021
 11:00 AM
 11:00 AM

INCIDENCIAS

SECCION DEL CONDUCTOR
 Nombres y Apellidos: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
 DNI: 71040000

SECCION DEL CONDUCTOR
 Nombres y Apellidos: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
 DNI: 71040000

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 24-07-2021

5
