BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	012-2021	07-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)
ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: CESE DE CAUASAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA Nª 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME Nº 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo.
Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•El día de hoy el contratista presento la prestación adicional Nº03 a la supervisión, referente a la incorporación al proyecto de 4 nuevos DMEs,

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.
•Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.
•El contratista presento el día de hoy el deductivo vinculante Nº 03 que deriva del adicional Nº03 a la supervisión, desestimando 4 DMEs.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15.
•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

OTRAS INCIDENCIAS
•El día de hoy, luego de que se llegase a un consenso entre trabajadores y contratista, se reanudaron los trabajos en distintos frentes del tramo. Asimismo, se reactivaron los trabajos del turno noche con las cuadrillas que se desempeñaban durante el día.

Recomendaciones:

Al contratista, se recomienda poner en marcha su plan de recuperación de avance programado.
A la supervisión, realizar seguimiento del plan de recuperación del contratista, asimismo verificar el cumplimiento de las normas durante los trabajos nocturnos.
A la supervisión, proceder con el análisis y evaluación del adicional Nº 03 presentado por el contratista.

Auditoria Fecha De Creación: 07-07-2021

Auditoria Fecha De Edición: 08-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 07-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 3+520

CDescripcion_____:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
Cuadrilla
1 Capataz
1 Ayudante

Foto1:

Foto2:

Foto3:

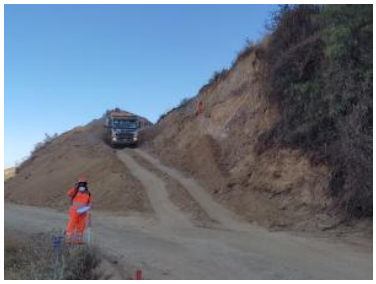

Fecha Toma De Datos: 07-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.E PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA 3+900

CDescripcion_____:
Equipos:
1 Motoniveladora
1 Rodillo vibrador
Cuadrilla:
1 Operario
1 Oficial
1 Ayudante vigía
1 oficial

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
203.A REMOCION DE DERRUMBES
PROGRESIVA 3+520

CDescripcion_____:
Equipos
1 Cargador sobre llantas
2 Volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 5+880

CDescripcion_____:
Equipos
1 Minicargador
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
1 oficiales
2 Ayudantes

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
Contaminación ambiental

CDescripcion_____:
A lo largo del tramo se registro gran contaminación por levantamiento de polvo y escaso riego de la vía.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 6+649 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudantes

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 7+200 DME 13

CDescripcion_____:
Equipos
1 Cargador sobre orugas
Cuadrilla
1 Operador
1 Operario
1 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 7+537 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes

Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-07-2021
